

旧羽田旭小学校整備計画のスケジュールの変更について

1 整備計画の概要と現在の状況

旧羽田旭小学校は平成15年から暫定的な用途で活用されている。


大田区公共施設等総合管理計画に基づき、令和元年11月に産業支援施設の整備とコミュニティセンター羽田旭の改築を決定し、現在、基本計画を策定中である。

2 現在の利用状況（用途）

創業支援施設（3月末で閉鎖）
コミュニティセンター羽田旭（開設中）

3 整備方針

- ・産業支援施設は民設民営とする。
 - ・コミュニティセンター羽田旭は機能更新を基本に整備する。
 - ・避難所機能は工事中も利用できるようにする。
 - ・近隣住民や利用者への影響を最小限とする計画とする。
- 以上を民間活力を最大限に活用し整備する。

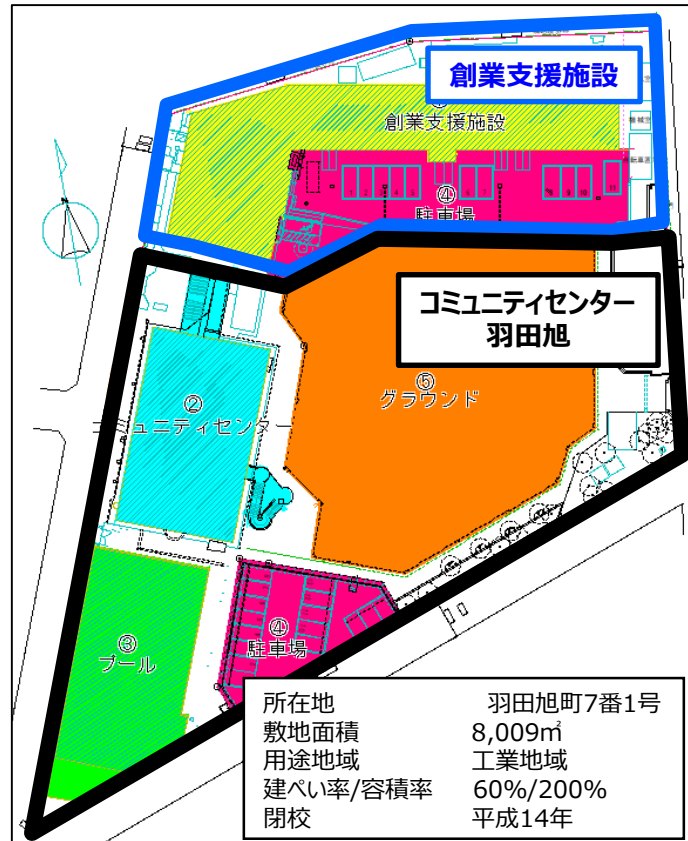

4 変更理由

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、改めて市場動向調査の実施と事業内容の再検討を行うため。

5 スケジュール（予定）

内容	変更前	変更後
基本計画策定・住民説明 事業者選定プロポーザル準備	令和2年4月～令和3年3月	令和2年4月～令和4年3月
事業者選定プロポーザル	令和3年5月～令和3年10月	令和4年5月～令和4年10月
施工	令和4年度以降	令和5年度以降
供用開始	令和5年度以降	令和6年度以降

※施工期間は事業者プロポーザルの結果によって変更する可能性がある
