


当該施設の緑化が完了したときは、速やかに緑化完了届の提出をお願いします！

1. 緑化完了届の提出

緑化完了届(正・副各1部)に必要な図書



図書名	
① 緑化完了届	
② 緑化面積確認表	
添付図書	③ 案内図(位置図)
	④ 緑化完了平面図・緑化面積等計算図 ◆写真を撮影した方向およびそれに対応する写真番号を記入してください ◆減算対象物(柵、基礎等)がある場合は根拠を記載し、緑化面積から減算してください
	⑤ 完了写真 ◆植栽の形状・寸法がわかるように、スケールを必ず添えてください
⑥ 緑化計画認定書の写し	
⑦ 委任状 (※変更がない場合は前回の写しで可)	
⑧ 個人情報の取り扱いに関する同意書 (※変更がない場合は前回の写しで可)	

*提出された緑化完了届に基づいて、現地調査を行うことがあります。

2. 緑化完了確認通知書の交付


緑化完了届の審査及び緑化計画の実施状況についての調査終了後、「緑化完了確認通知書」を交付します。

撮影担当者の方へ




- ・植栽本数がわかる全景写真を撮影してください。
- ・接道緑化長さ(L)、樹木の高さ(H)・枝振り(W)は、スケールの目盛りがぼやけないように撮影してください。

裏面に完了写真の作成例があります

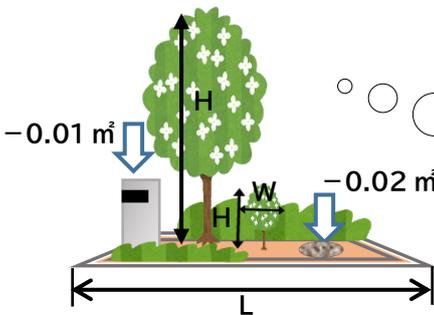

高木・中木は「高さ」
低木は「高さ」と「枝振り」の計測が必要です

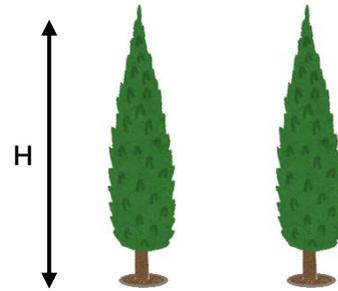

緑地帯のポイント

- ①長さ、高さ、枝振りの数値を確認できますか？
- ②本数を確認できる全景写真はありますか？
- ③減算対象物(基礎、柵、樋、メーター等)が緑地帯の中にある場合は減算しましたか？

単独木等のポイント

- ①単独木は樹冠が他の樹木と被っていませんか？
- ②単独木は、他の樹木と独立していますか？
- ③樹冠投影面積の撮影は非常に困難です。設計者とよく打合せし、変更する場合は速やかにご連絡ください。

完了写真 作成例

〇〇新築工事 完了写真

写っていますか？
完了写真チェックポイント

- ☑ 全景(植栽本数がわかるように)
- ☑ 接道緑化の長さ
(スケール目盛りが見えるように)
- ☑ 高木、中木の高さ
(スケール目盛りが見えるように)
- ☑ 低木の高さ、枝振り
(スケール目盛りが見えるように)



緑地帯 1
(緑地帯全景)
接道長さ L=1.65m
減算 照明(200φ)1か所
低木 アジサイ3本
地被 ヤブラン




緑地帯 1
(接道 接写)
接道長さ L=1.65m



低木 1
アジサイ
H=0.3m以上
W=0.4m

-1-
-2-
-3-



※計画の変更が生じた場合はお問い合わせください。

【問合先】 大田区まちづくり推進部建築審査課 建築指導担当 電話 5744-1387
