3 工事工程表

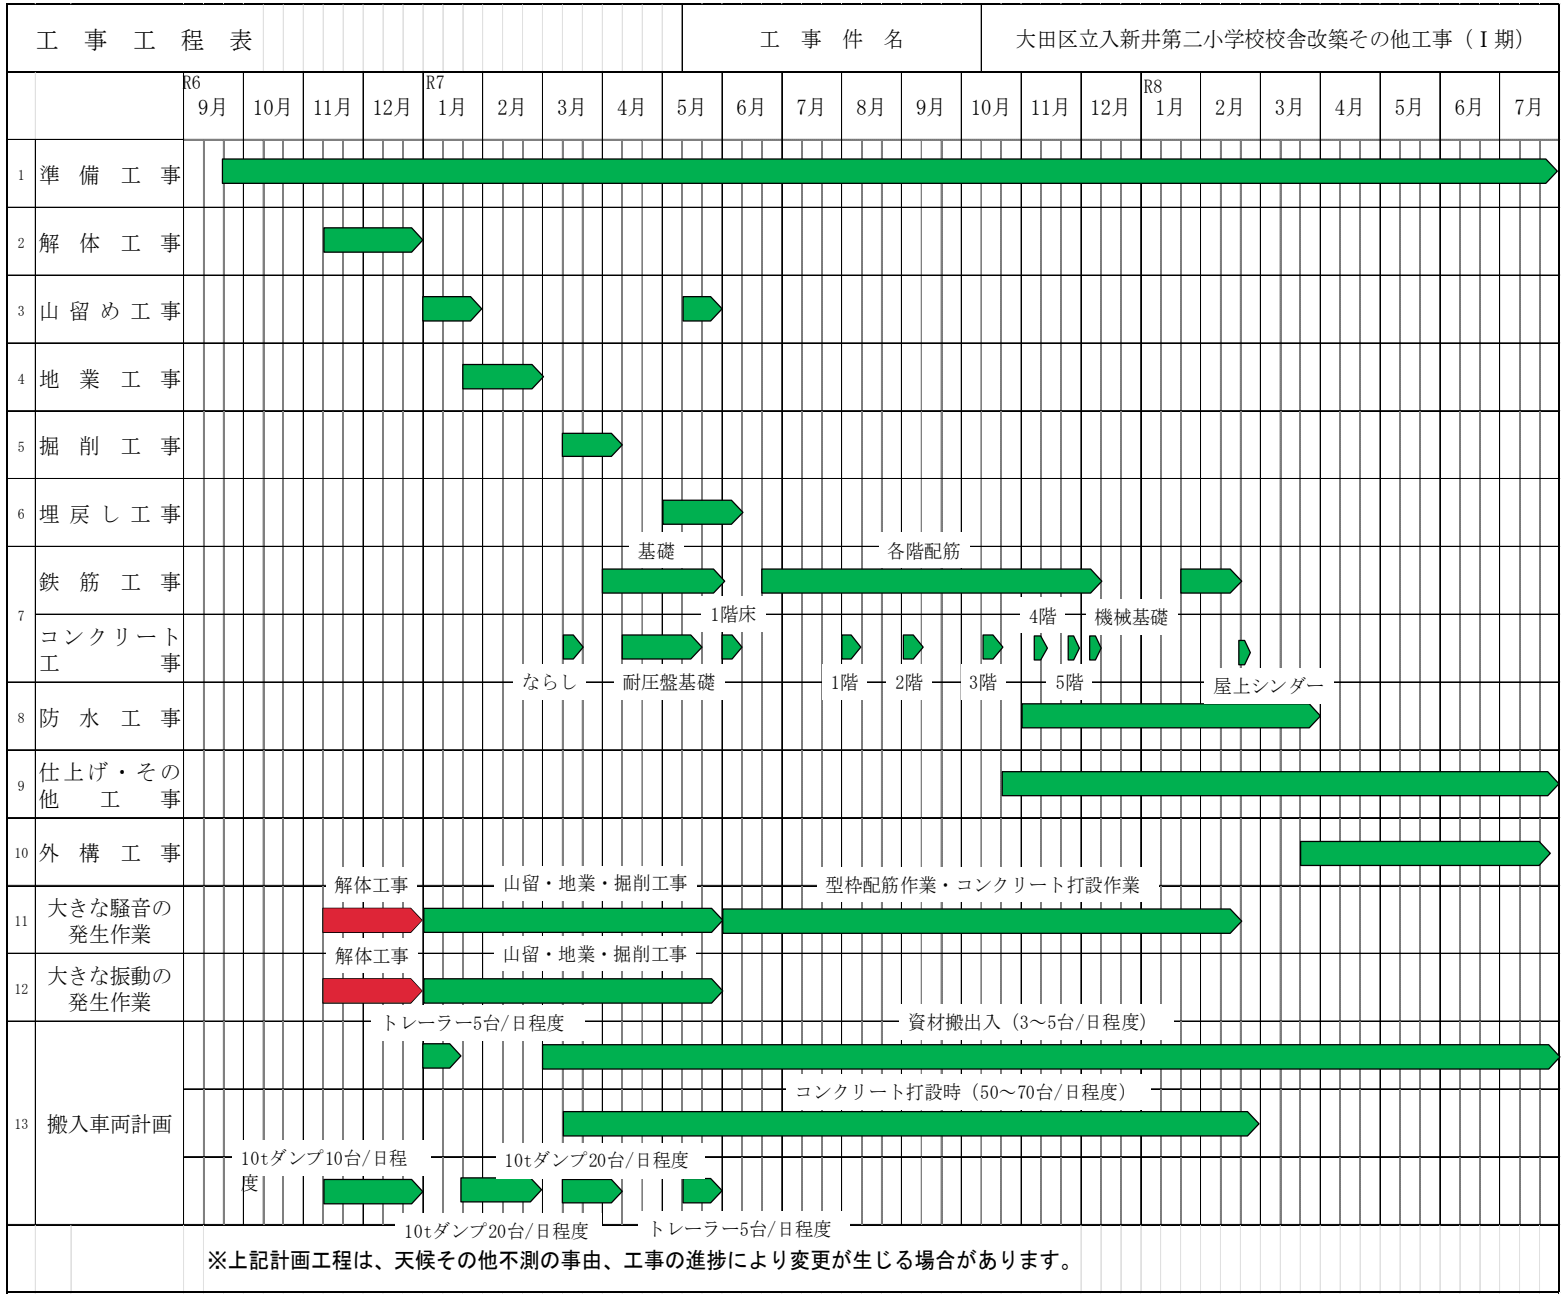
工事工程表
工事件名
大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事（Ⅰ期）
R6
R7
R8
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
1 準備工事
2 解体工事
3 山留め工事
4 地業工事
5 掘削工事
6 埋戻し工事
7 鉄筋工事
コンクリート工事
基礎
各階配筋
1階床
4階
機械基礎
ならし
耐圧盤基礎
1階
2階
3階
5階
屋上シンダー
8 防水工事
9 仕上げ・その他工事
10 外構工事
11 大きな騒音の発生作業
解体工事
山留・地業・掘削工事
型枠配筋作業・コンクリート打設作業
12 大きな振動の発生作業
解体工事
山留・地業・掘削工事
13 搬入車両計画
トレーラー5台/日程度
資材搬出入（3～5台/日程度）
コンクリート打設時（50～70台/日程度）
10tダンプ10台/日程度
10tダンプ20台/日程度
10tダンプ20台/日程度
トレーラー5台/日程度
※上記計画工程は、天候その他不測の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。
